

阿蘇大橋地区斜面防災対策工事 現場だより

阿蘇大橋地区において発生した大規模な斜面崩壊について、斜面上部に残る多量の不安定な土砂の崩壊による二次災害を防ぐため、緊急的な対策の調査・工事を実施しています。

工事は順調に進捗しており、1月から土留盛土工（下段）より下の作業においては、有人による作業が出来るようになりました。（※土留盛土工（上段）より上の作業は、無人化施工です）

現在、斜面中腹崩壊土除去工、頭部工事用道路工等を行っています。梅雨明けとなりましたが、阿蘇大橋地区では急な雷雨や夕立が続いています。蟬の鳴き声が聞こえてくる時期となりました。暑い日が続きますので熱中症にはお気を付けください。今月もどうぞ宜しくお願い致します。




阿蘇大橋地区斜面崩壊対策の進捗状況（平成29年7月24日撮影）



全景写真（ドローンによる撮影）



土留盛土工（ドローンによる撮影）

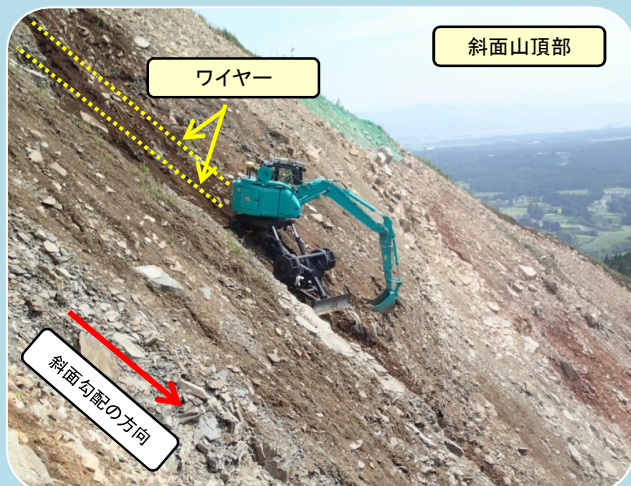

斜面中腹崩壊土除去工状況写真①

□斜面山頂部からワイヤーを吊り下げたロッククライミングマシンです。斜面に堆積している崩壊土砂の除去を行っています□

※無人化施工で工事を行っています。



斜面中腹崩壊土除去工状況写真②

□標高約750メートルの高所で作業を行っています。写真では小さく見えるロッククライミングマシンですが、全長が9メートル、幅が2.9メートル、高さが3.3メートルあります。重さはなんと約20トンもあります！□



頭部工事用道路(山頂ルート)施工状況写真

□山頂部へアクセスするための工事用道路をつくっています。路床盛土工を行っています□



頭部工事用道路(大分側ルート)全景写真

□頭部工事用道路の完成後は、車両でも山頂部まで通行することが可能となります！□

～事務局より ホットと一息～



7月も終わり、8月を迎えました。お盆休みで帰省される方、旅行に行かれる方、ご自宅でゆっくりと過ごされる方などいらっしゃると思います。今年も皆様にとって良い思い出となりますように。工事の方は、1日でも早い復旧のためにお盆期間中も工事を行う予定です。

高める、つくる、そして、支える。



熊谷組

【お問い合わせ・連絡先】

(株)熊谷組 九州支店

Tel 092-721-0215

担当：西尾

(株)熊谷組 阿蘇無人化作業所

Tel 096-285-4274

担当：土居、伊藤
